Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

CHAUFFAGE SANITAIRE RIEHL

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État de l'installation avant intervention

CLIENT	**M. et Mme Wolff (exemple)**
OBJET	**Mise en eau et équilibrage du plancher chauffant**
ADRESSE DU SITE	**18 rue des Vergers, 67800 Hœnheim** Maison neuve, étage
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Maison en construction, boucles posées et chape coulée : raccordement du collecteur, mise en eau et réglage du plancher chauffant.

2. Prestations réalisées


PRESTATION	DESCRIPTIF
Émetteurs / réseau	Collecteur de neuf départs raccordé, débitmètres sur chaque boucle, purgeurs et vanne d'isolement en extrémité.
Régulation	Remplissage, purge boucle par boucle, réglage du module de mélange et équilibrage des débits selon la longueur des boucles.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique

1. Collecteur du plancher chauffant

Neuf boucles raccordées sous le collecteur, mur à l'enduit brut. Boucles purgées une à une, débits réglés entre 1 et 3 l/min.

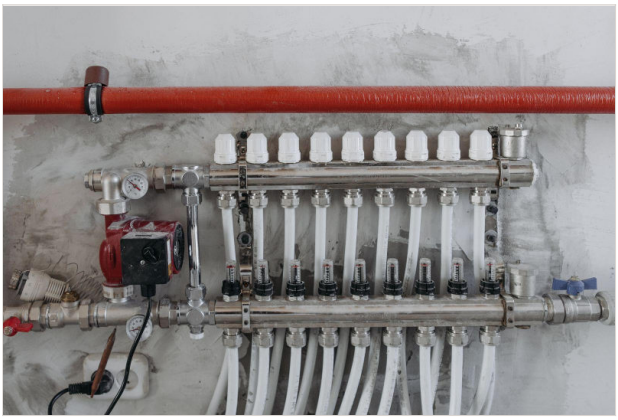

Collecteur de neuf départs, débitmètres réglés



Module de mélange, thermomètre de départ

Vues d'ensemble



Couloir de l'étage : chape coulée, enduits réalisés

4. Conclusion

Plancher chauffant mis en eau et équilibré, étanchéité contrôlée à 6 bar sans perte de pression, départ limité à 35 °C. Première mise en chauffe au plus tôt 21 jours après le coulage de la chape.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par CHAUFFAGE SANITAIRE RIEHL

CHAUFFAGE SANITAIRE RIEHL, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 65, chauffage.
