Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

PLÂTRERIE HAEGEL

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État du support avant intervention

CLIENT	**M. et Mme Schmitt (exemple)**
OBJET	**Doublage et rampants des combles en plaques de plâtre**
ADRESSE DU SITE	**7 rue des Vosges, 67210 Obernai** Combles, mur pignon et rampants
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Aménagement des combles : mur pignon maçonné brut et rampants à habiller. Plaques hydrofuges retenues sur tout le niveau à la demande des clients.

2. Prestations réalisées


PRESTATION	DESCRIPTIF
Plaques / cloisons	Doublage du pignon sur fourrures métalliques à entraxe de 60 cm, plaques hydrofuges de 13 mm vissées, jeu de 1 cm en pied.
Plafonds	Rampants en plaques hydrofuges de 13 mm vissées sur fourrures suspendues, attentes électriques laissées aux emplacements des luminaires.
Joints / finition	Bandes noyées dans l'enduit sur toutes les jonctions de plaques, têtes de vis enduites. Première passe.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique

1. Doublage du mur pignon

Mur maçonné brut, gaine électrique en attente : implantation des rails tracée au laser. Doublage posé en plaques hydrofuges, aplomb contrôlé au laser, têtes de vis enduites.

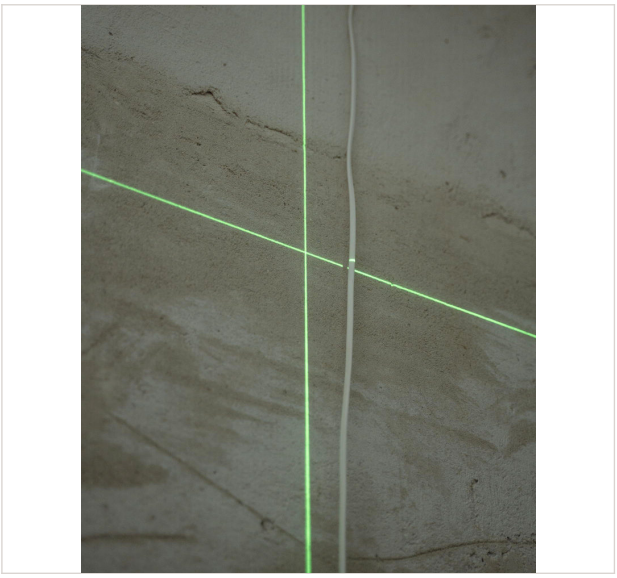

AVANT

Pignon brut, implantation tracée au laser



APRÈS

Plaques hydrofuges posées, vis enduites, aplomb contrôlé

Vues d'ensemble



Rampants bandés en première passe, attentes des luminaires

4. Conclusion

Doublage et rampants posés, joints bandés en première passe. Planéité contrôlée à la règle de 2 m : écart inférieur à 5 mm. Seconde passe d'enduit et ponçage au prochain passage, puis support prêt à peindre. Ne pas peindre avant séchage complet de l'enduit.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par PLÂTRERIE HAEGEL

PLÂTRERIE HAEGEL, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 25, plâtrerie.
