Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

PLOMBERIE SANITAIRE WEBER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État de l'installation avant intervention

CLIENT	**Copropriété Les Tilleuls (exemple)**
OBJET	**Remplacement des alimentations de la cuisine**
ADRESSE DU SITE	**12 rue des Tilleuls, 67000 Strasbourg** Cuisine, rez-de-chaussée
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Alimentations de la cuisine en acier galvanisé, corrodées, robinets d'arrêt grippés : remplacement complet avant la pose du mobilier.

2. Prestations réalisées


PRESTATION	DESCRIPTIF
Alimentation	Deux alimentations neuves en multicouche de 16 mm, eau froide et eau chaude, robinet d'arrêt quart de tour sur l'eau froide.
Évacuation	Évacuation de l'évier en PVC de 40 mm, avec pente vers la chute, bouchonnée en attente.

3. Constats et travaux : reportage photographique

1. Alimentations de la cuisine


Alimentations corrodées, robinets d'arrêt grippés. Remplacées en multicouche, raccords contrôlés.

EXEMPLE

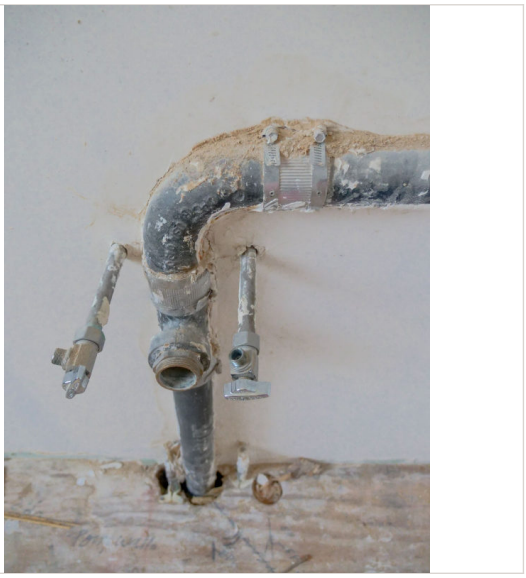

AVANT

Alimentations corrodées, robinets d'arrêt grippés

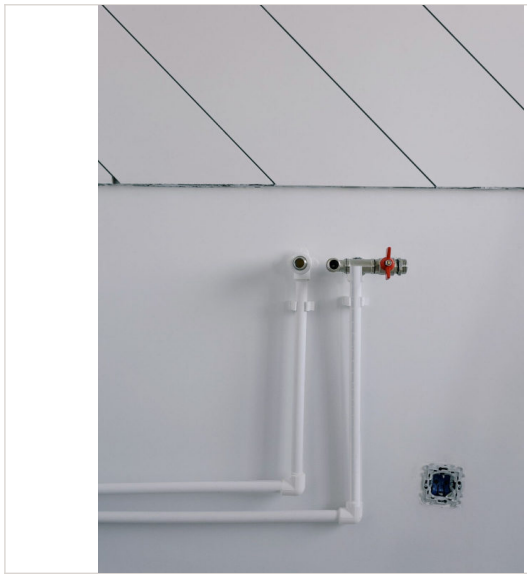

APRÈS

Alimentations neuves en attente, robinet d'arrêt posé

Vues d'ensemble



Cuisine en fin d'intervention : prête pour la pose du mobilier

4. Conclusion

Alimentations remplacées, évacuation créée. Épreuve de pression à 10 bar pendant 30 minutes et essai d'écoulement conformes. Ne pas ouvrir le robinet d'arrêt avant le raccordement de l'évier.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par PLOMBERIE SANITAIRE WEBER

PLOMBERIE SANITAIRE WEBER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 60, plomberie sanitaire.
